# Familie-, børne- og læringsudvalget

**10. november 2026**

# Orientering om status

- Kapacitetsudvidelse af Pindstrupskolen og filial på Mørke Skole
- Mørke Skole - faglokaler

- **Orientering om brugerproces Mørke + Pindstrup specialafdeling på Mørke Skole og tekniske undersøgelser på begge skoler**

**Mørke Skole**

- Opstarten af brugerprocessen er udsat til medio november 2026 som følge af, at den indledende pædagogiske proces for medarbejderne på Mørke Skole endnu ikke er gennemført. Totalrådgiveren bistår med denne proces.

- Totalrådgiver har igangsat de indledende forundersøgelser på Mørke Skole, herunder undersøgelser af tekniske installationer og miljøundersøgelse af bygninger. (Eventuelle miljøfarlige stoffer i bygningsdele)

**Pindstrupskolen**

- Der er opstartet brugerproces med byggeudvalget i oktober 2026, og den videre proces koordineres med brugermøderne på Mørke Skole.

  Der arbejdes samtidig på at tilrettelægge brugerprocesserne, således at den senere opstart på Mørke Skole ikke påvirker projektets samlede tids- og procesplan med gennemførelse af brugerprocesserne ved udgangen af 2026.

- Totalrådgiver har igangsat landinspektøropmåling, servitutredegørelse og ledningsoplysninger på Pindstrupskolen.

# Brugerprocessen


**Brugerproces – Illustration af proces i 3 parallelle spor, heraf 2 i Mørke**

Skulle have startet i oktober 2026

November - december 2026

December 2026

Oktober - december 2026

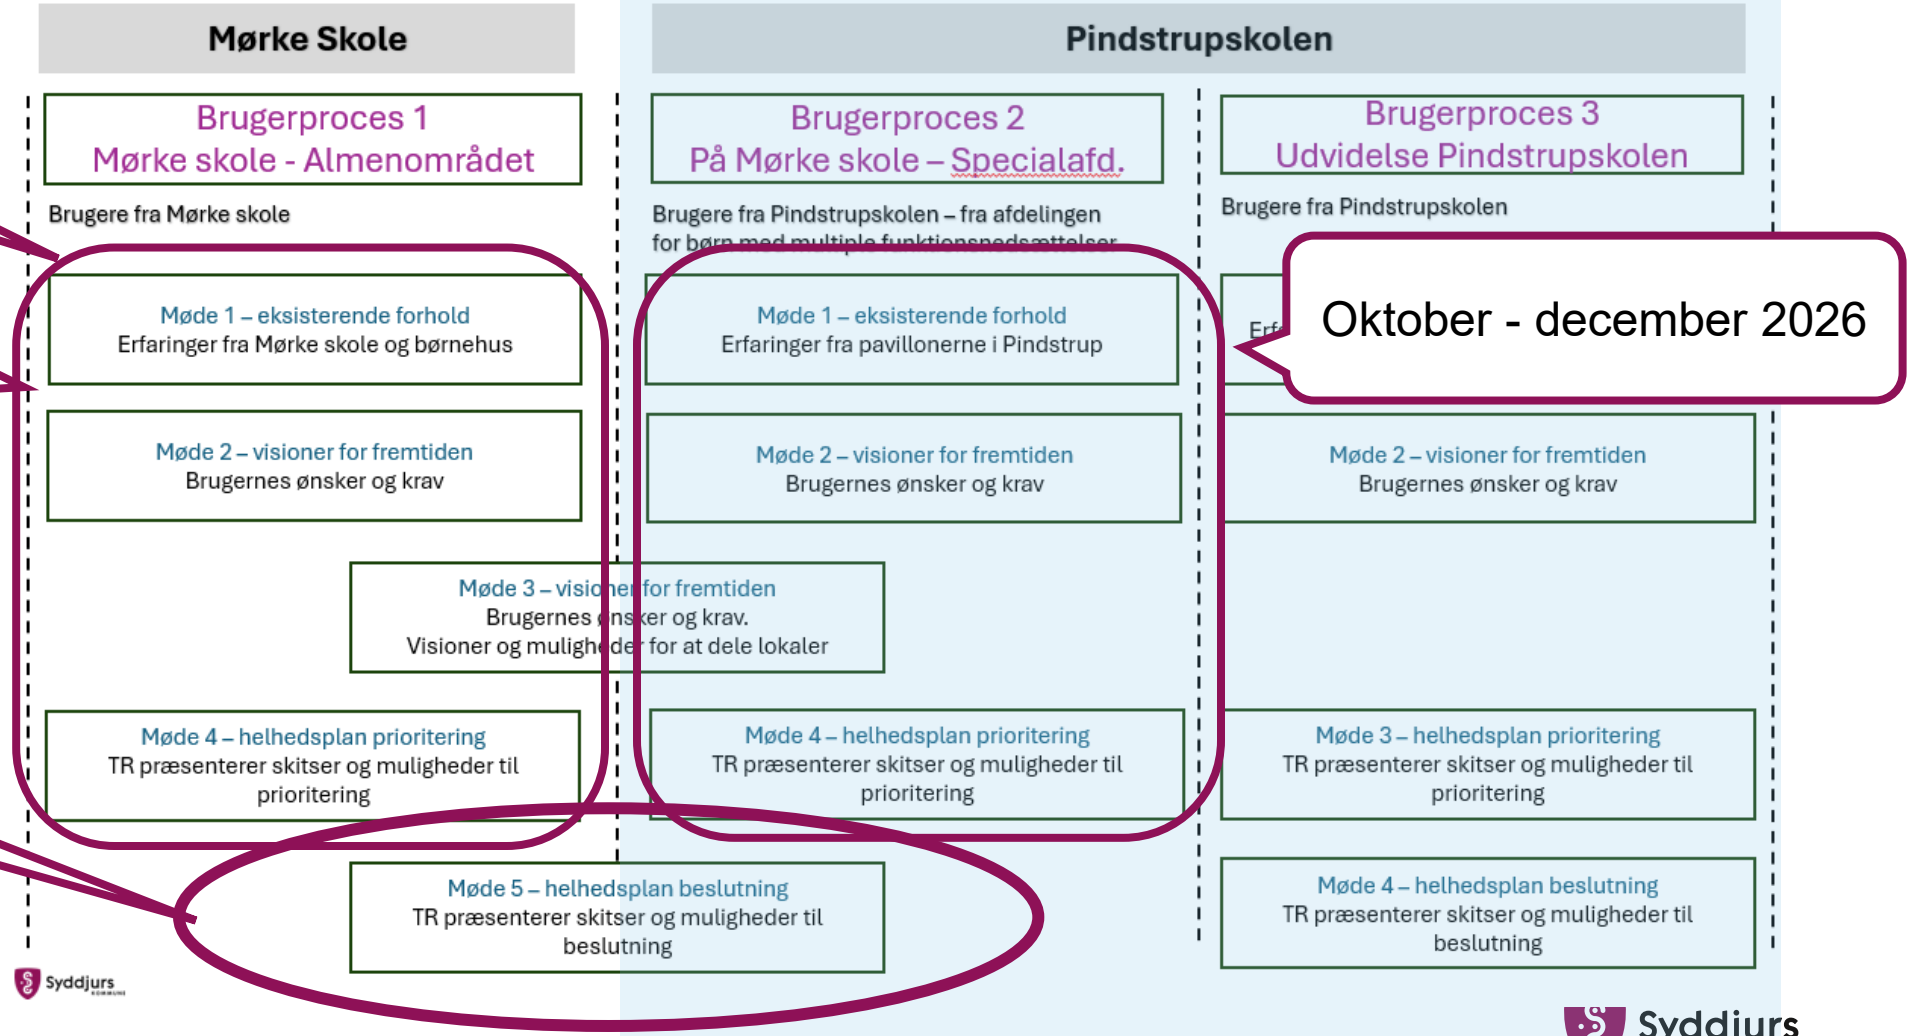




Syddjurs KOMMUNE
