Kapacitetsudvidelse af Pindstrupskolen

Udbygning af Pindstrupskolen og filial på Mørke Skole

Familie-, børne- og læringsudvalget 11. august 2026

Kapacitetsudvidelse Pindstrupskolen
Budget 2025

Budgetaftalen

På baggrund af et stigende børnetal på Pindstrupskolen er forligspartierne enige om at afsætte anlægsmidler til en udvidelse og samling af specialskolen. Udvidelsen vil give skolen lokaler og faciliteter til en udvidet målgruppe af elever med fysiske og kognitive handicaps, som i dag går i andre specialskoletilbud. I budgetperioden afsættes samlet 41,6 mio. kr.

Forligspartierne ønsker undersøgt, om udbygningen af Pindstrupskolens tilbud med fordel kan suppleres med en mere geografisk central lokalitet i kommunen. Der skal i den forbindelse indgå en vurdering af de faglige og økonomiske konsekvenser ved en sådan løsning. Endelig ønsker forligspartierne, at der er et generelt fokus på en øget effektivisering af transporten for elever til specialskoletilbud.

Kapacitetsudvidelse Pindstrupskolen
Budgetaftale 2025

Beslutning i forbindelse med Budget 2025

- Specialskolen i Pindstrup skal udvides og samles.
- Udvides med målgruppe af elever med multiple funktionsnedsættelser
- Samling af elever fra Tøstrup afdelingen i Pindstrup – afdeling i lejede lokaler
- Anlægssum 41,6 mio. kr.
- Det undersøges, om udbygningen af Pindstrupskolen med fordel kan suppleres med en mere geografisk central lokalitet i Syddjurs Kommune
- Undersøgelse af en øget effektivisering af transporten for elever til specialtilbuddet

Resultat af undersøgelses- og planlægningsfasen i 2025

- En forøgelse af antallet af elever med multiple funktionsnedsættelser til 25 elever i skoletilbud til 10 klassetrin
- Et presset areal i Pindstrup med for lidt plads til den samlede udvidelse:
  - udvidelsen med målgruppen af elever med multiple funktionsnedsættelser
  - Indflytning af elever fra Tøstrup afdelingen
  - Vækst i elevtal generelt
  - Øgede personalefaciliteter og parkering
- Screening af centralt beliggende kommunale bygninger med ledig kapacitet – Resultat: Mørke Skole



Syddjurs KOMMUNE

Kapacitetsudvidelse Pindstrupskolen
Budgetaftale 2026

Budgetaftale

Byrådet har tidligere besluttet, at Pindstrupskolen også skal rumme børn med multiple funktionsnedsættelser, så målgruppen tilbydes et skoletilbud i Syddjurs Kommune.

Da de fysiske rammer i Pindstrup er begrænsede, er partierne derfor enige om at arbejde videre med etableringen af en afdeling af Pindstrupskolen på Mørke Skole. Hertil afsættes yderligere 9,5 mio. kr. til opgradering og flytning af faglokalerne. Den nærmere planlægning af om- og tilbygningen skal ske i tæt dialog med forældrebestyrelser, ledere og medarbejdere fra Mørke Skole, dagtilbud og Pindstrupskolen, så de fysiske rammer tilgodeser både Mørke Skole og Pindstrupskolens afdeling.

Partierne følger elevtalsudviklingen på Mørke Skole tæt, da prognosen viser stigende elevtal. Om- og tilbygningen skal tilrettelægges, så det sikres, at der er den nødvendige plads til at drive folkeskole, og at der kan skabes mulighed for en fremtidig udvidelse af skolens 0.–9. klasse, hvis behovet opstår.

Kapacitetsudvidelse Pindstrupskolen
Budget 2026

Beslutning i forbindelse med Budget 2026

- Budgetrammen udvides til 46,6 mio. kr. på grund af omkostningerne til nybyggeri så elever fra Tøstrup afdelingen kan flyttes til Pindstrup, personale- og parkeringsforhold udbygges
- Etablering af afdeling af Pindstrupskolen på Mørke Skole, hvor faglokaler flyttes og opgraderes for at frigøre plads til elever med multiple funktionsnedsættelser.
- Afsættelse af yderligere 9,5 mio. kr. til opgradering og flytning af faglokaler
- Udvidelser, ombygning og flytning af funktioner skal ske i tæt dialog med forældrebestyrelser, ledere og medarbejdere fra både Mørke Skole og Pindstrupskolen

Resultat af planlægningsfasen i 2026

- Beskrives på de kommende slides.

Mørke Skole - Faglokaler
Pindstrupskolen – Udvidelse og afdeling i Mørke

Beskrivelse af Anlægsprojektet i anlægskataloget

De to projekter hænger tæt sammen og skal samlet set udvide kapaciteten på specialskoleområdet.

Pindstrupskolen – Udvidelse

- Udvides med nye bygninger, indflytning af elever fra Tøstrup, bedre personalefaciliteter og særlige rammer til elever med multiple funktionsnedsættelser.
- Projektet er nødvendigt, fordi der er pladsmangel, og fordi skolens nuværende areal ikke kan rumme hele behovet. Derfor etableres løsningen som en delt skole på to lokationer.
- Ibrugtagning forventes i 2029.

Mørke Skole – Faglokaler

- Ombygges og opgraderes for at huse målgruppen af elever med multiple funktionsnedsættelser (fysisk og kognitivt).
- Det kræver omrokering og modernisering af faglokaler, men udnytter eksisterende ledig kapacitet. Det sikres, at der er mulighed for evt. fremtidig kapacitetsudvidelse af Mørke skole.
- Ibrugtagning forventes i 2028.

Samlet set sikrer projekterne bedre fysiske rammer, mulighed for flere elever og en mere fleksibel og fremtidssikret løsning ved at fordele specialtilbuddet på to lokationer i stedet for at bygge det hele ét sted.

Syddjurs KOMMUNE

Mørke Skole - Faglokaler
Pindstrupskolen – Udvidelse og afdeling i Mørke

Projekterne i Pindstrup og byggesagen i Mørke har indbyrdes store afhængigheder

- Rokader og færdiggørelser er indbyrdes afhængige i forhold til både tidsplan og økonomi.

Rækkefølgen på projekterne:

- Ombygning af Mørke Skole med frigivelse af areal til specialskoleafdeling og faglokaler
- Etablering af specialskoleafdeling og indflytning af elever, som i dag undervises i midlertidige pavilloner ved Pindstrupskolen
- Udfasning af pavillonløsningen
- Udbygning af Pindstrupskolen
- Ombygning af personalefaciliteter
- Indflytning af elever fra Tøstrup-afdelingen

Syddjurs KOMMUNE

Mørke Skole - Faglokaler
Pindstrupskolen – Udvidelse og afdeling i Mørke

Idéoplæg - Visioner og opgaver

Grundlag for projektet, som beskriver visioner, rammer og retning og danner grundlag for totalrådgiverens videre proces.

Formål


- Give et generelt overblik over de tre delopgaver
- Fastlægger retning og ambitioner for projektet
- Samler pædagogiske, funktionelle og bæredygtige visioner

Indhold

- Baggrund og kontekst for skolerne
- Pædagogiske visioner for hver af de tre delopgaver
- Arkitektoniske og funktionelle visioner og krav til rum som understøtter de forskellige målgrupper.
- Bæredygtighedsmålsætning samt inspiration til konkrete valg
- Opgavebeskrivelser og omfang

Mørke Skole - Faglokaler
Pindstrupskolen – Udvidelse og afdeling i Mørke

Illustration af Visioner og opgaver

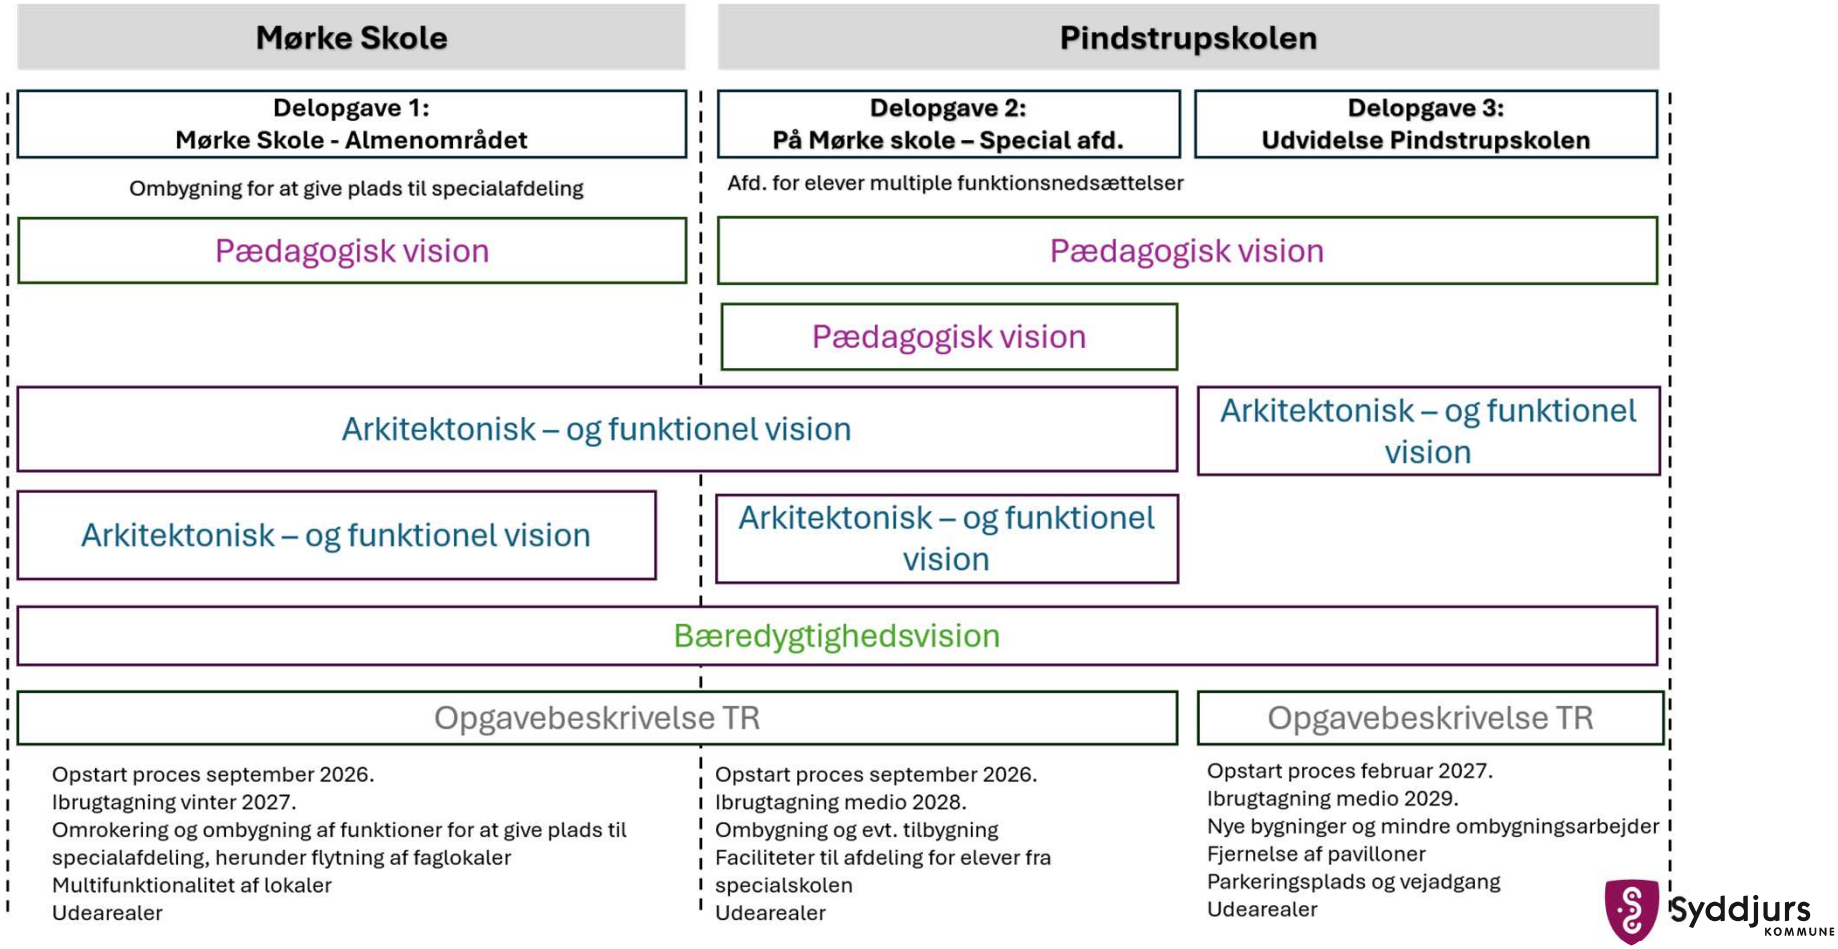

Syddjurs KOMMUNE

Mørke Skole - Faglokaler
Pindstrupskolen – Udvidelse og afdeling i Mørke

Brugerproces

- Grundlag og krav til brugerprocessen som totalrådgiverteamet skal forberede og gennemføre for brugergrupperne.

Formål med brugerprocessen

- Sikre løsninger der understøtter hverdag, læring og trivsel.
- Indsamler brugernes erfaring og behov
- Kvalificere arbejdet med helhedsplanen
- Brugerprocessen danner grundlag for den videre projektering

3 parallelle opgavespor

Processen er delt i tre parallelle spor, der flettes sammen for at sikre helhedsorienterede og gensidigt afhængige beslutninger.

- Eksisterende forhold - erfaring fra hverdagen
- Visioner – Brugernes ønsker og krav
- Helhedsplan – prioritering og beslutning


Brugergruppe

- Ledelse, medarbejder- og bestyrelsesrepræsentanter samt relevante fagpersoner.
- Endelig sammensætning fastlægges i samarbejde med skoleledelsen på de to skoler.

Syddjurs KOMMUNE

Mørke Skole - Faglokaler
Pindstrupskolen – Udvidelse og afdeling i Mørke

Brugerproces – Illustration af proces i 3 parallelle spor

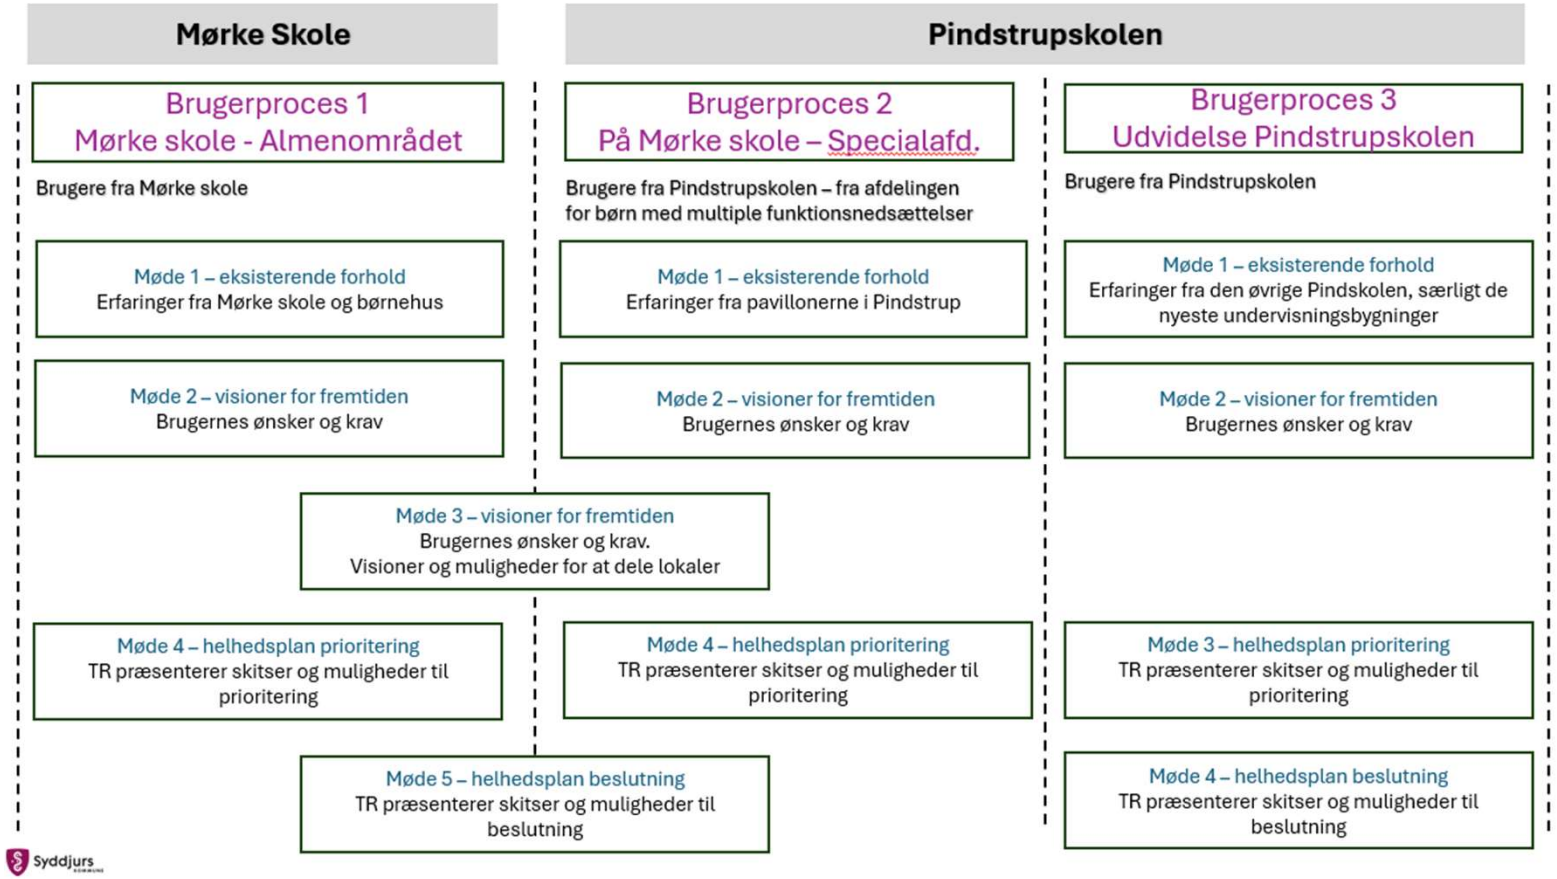

Syddjurs KOMMUNE
